

Pkt. 6, Bilag til Fælles Faglige Begrebers projektbeskrivelse

Baggrund og formål

Følgende er bilag til den fælles projektbeskrivelse der samler og gennemfører to initiativer:

- initiativ 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, samt
- initiativ 3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Bilaget beskriver projektets fase 3: test og pilot, samt fase 4: implementering.

Formålet med dette projekt er digitalt at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis. En af forudsætningerne for dette er at sikre, at de faglige metoder og it-understøttelsen på området anvender fælles faglige begreber, i en ensartet dokumentationspraksis hos myndighed og udfører og på tværs af kommunerne – både i visitationen og i opfølgningen på effekten af indsatserne på socialområdet.

Projektets hovedleverancer i fase 1 og 2 er fælles faglige begreber for funktionsevne og indsatser, og at disse begreber standardiseres, struktureres og klassificeres. Et fælleskommunalt sæt af data, der bygger på fælles begreber af denne karakter, er forudsætningen for, at kommunerne kan få mere viden om effekten af de kommunale sociale tilbud, samt at dialogen mellem borger, kommune og tilbud styrkes. Et andet perspektiv på fælleskommunale standardiserede og strukturerede datasæt er, at kommunerne i fremtiden kan udnytte potentialer i machine learning, kunstig intelligens mv., og at disse muligheder kan udvikles og anvendes i fællesskab.

Fase 3: Test og pilot (januar 2019 - december 2019)

Fase 3 skal gennemføre en intern- og en ekstern test og pilot af projektets leverancer fra projektets første to faser, samt forberede implementeringsfasen.

Leverancer

- Intern test og pilot gennemføres i samarbejde med kommunerne.
- Løbende dialog med it-leverandørerne i gennemførelsen af ekstern test og pilot.
- Opbygning af implementeringsunderstøttende organisation.
- Udarbejdelse af implementeringsunderstøttende materialer.
- Identificering af hvilke data kommunerne har behov for fra it-fagsystemet (uddata) til hhv. national- og lokal ledelsesinformation – herunder indberetning til nationale statistikker, samt udarbejde specificering af

Dato: 25. oktober 2017

Sags ID: SAG-2017-05543
Dok. ID: 2437128

E-mail: RALU@kl.dk
Direkte: 3370 3134

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 4

integration til FLIS. Dette foregår i samarbejde med KL' Økonomiske Sekretariat og KOMBIT.

Dato: 25. oktober 2017

Sags ID: SAG-2017-05543
Dok. ID: 2437128

E-mail: RALU@kl.dk
Direkte: 3370 3134

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 4

Succeskriterier

- Med 98 Kommuner, 1685¹ sociale tilbud (herunder skal tillægges sociale tilbud under SEL§85 og ABL§105), og 4 it-leverandører er størrelsen på implementeringsrettede aktører anseelig. Implementeringsorganisationen og de implementeringsunderstøttende materialer skal tilrettelægges sådan, at alle aktørerne finder støtte og nytte heraf.
- Ved udarbejdelsen af projektets implementeringsunderstøttende leverancer, drager projektet i relevant omfang nytte af erfaringer, fra bl.a. Fælles Sprog III, Det Fælles Medicinkort, og Center For Velfærdsteknologi i vurderingen af virksomme aktiviteter forbundet med lokal implementeringsunderstøttelse.
- Test og pilotfasen skal gennemføres sådan, at der sikres feedback til Fælles Faglige Begrebers leverancer, med henblik på justering inden implementeringsfasen.
- Et stærkt samarbejde med Socialstyrelsen om udviklingsarbejdet i relationen mellem Fælles Faglige Begreber og Voksenudredningsmetoden (VUM).
- Klar og entydig dialog med de fire it-leverandører for at sikre den nødvendige it-understøttelse inden implementeringsfasen.

Fase 4: Implementering (januar 2020 - december 2021)

Implementeringsfasen gennemføres i et samarbejde mellem KL og relevante samarbejdspartnere med høj faglig viden om kommunernes arbejde med VUM, projektorganisering og ledelse ved implementering af it-systemer samt kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere.

Leverancer

- Sikrer planlægning og gennemførelse af fælleskommunale implementeringsunderstøttende aktiviteter.
- Sikrer kommunernes adgang til understøttelse af den lokale implementeringsproces, herunder opgaver relateret mod den lokale projektledelse, monitorering- og sikring af fremdrift.
- Understøtter kommunernes realisering af projektets gevinstpotentialer.
- Der skal etableres national kompetenceudvikling af medarbejdere på sociale tilbud og myndighedsafdelinger i 98 kommuner, så Fælles Faglige Begreber forankres i den daglige dokumentationspraksis. Projektet skal sikre kommunernes adgang til sådanne kompetenceudviklingstilbud.
- Med henblik på drift og vedligeholdelse af fælles begreber for funktionsevne, indsatser og dokumentationspraksis, gennemføres en evaluering af projektet. Evalueringen overdrages til governanceorganisationen.

¹ Opgørelse fra Tilbudsportalen over tilsynspligtige tilbud på §107, §108, §103 & §104. Indeholder både offentlige og private tilbud. Dato for udtræk: 01-11-2017.

Succeskriterier

- Projektet skal sikre understøttelse af den lokale implementering gennem understøttende redskaber, vejledninger, vidensdeling m.v. Disse værende eksempelvis opfølgingsanalyse til brug lokalt, dokumentationshåndbøger, e-læring m.v. Dette findes vigtigt i ambitionen om at sikre robusthed i implementerings- og gevinstrealiseringen.
- Projektet skal sikre forankring fremadrettet gennem stærke samarbejder med centrale aktører på socialområdet, der metodisk og formidlingsmæssigt kan skabe sammenhæng til nuværende systematik og fremgangsmåde for det lokale socialfaglige arbejde.
- Projektet afsluttes med en evaluering, der sikrer den nødvendige vidensoverdragelse til governanceorganisationen med henblik på varetagelse af kommunernes løbende behov for videreudvikling, samt i relevant omfang at overdrage viden til andre fælleskommunale projekter.

Dato: 25. oktober 2017

Sags ID: SAG-2017-05543
Dok. ID: 2437128


E-mail: RALU@kl.dk
Direkte: 3370 3134

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 4

Tidsplan

Af følgende tidsplan fremgår de overordnede test, pilot og implementerings-understøttende aktiviteter i fase 3 og 4 i årene 2018 tom. 2021.

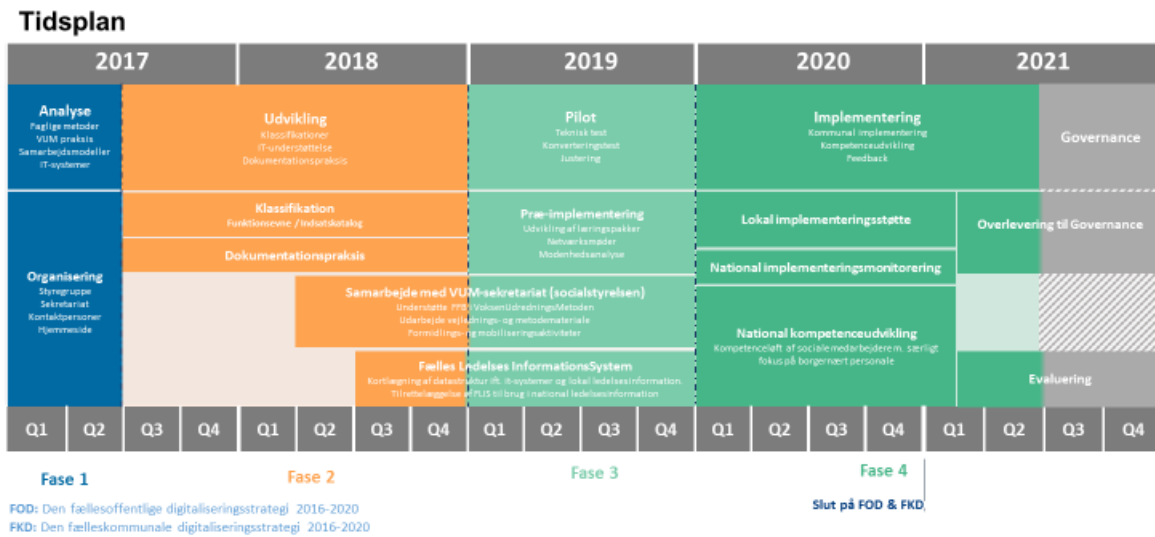

Risikovurdering

1. It-udviklingen kan udgøre en risiko for projektet, hvis ikke denne understøtter projektets slutleverancer.

Konsekvensen kan være, at projektet ikke kan implementeres efter hensigten, og de ønskede gevinster ikke kan realiseres.

2. Kommunernes eksisterende arbejde med resultatdokumentation kan udgøre en risiko for projektet, såfremt projektet ikke opnår at understøtte de allerede igangværende initiativer.

Konsekvensen kan være, at projektet får modstand og ikke opnår tilstrækkelig opbakning fra kommunerne. Hvis det viser sig, at en stor andel af landets kommuner allerede arbejder med resultatdokumentation, kan en konsekvens være, at disse kommuner ikke kan se, at projektet understøtter deres eksisterende arbejde. Projektet bliver ikke fuldt implementeret, såfremt nogle kommuner undlader at anvende projektets resultatdokumentation og fx kun implementerer det fælles indsatskatalog.

3. Det er en risiko, at Fælles Faglige Begreber ikke bliver succesfuldt forankret i Voksenudredningsmetoden (VUM).

Konsekvensen kan være, at implementeringen af projekt Fælles Faglige Begreber vanskeliggøres. Det kan betyde, at de kommuner, der arbejder efter VUM, vil have svært ved at tage projektet i brug.

4. Der er risiko for, at kommunerne ikke prioriterer deltagelse i projektet højt nok.

Konsekvensen kan være, at kommunerne ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i projektet. Det kan betyde, at projektet ikke får den fornødne viden om kommunernes nuværende metoder, it-systemer, samarbejdsmodeller og dokumentationspraksis, som får en konsekvens for udviklingen af alle projektets slutleverancer. Dernæst kan det få konsekvenser for opbakningen til projektet.

5. Der er risiko for, at medarbejderne i myndighedsafdelingerne og på de sociale tilbud ikke vil tilslutte sig de nye klassifikationer og it-dokumentations standarder.

Konsekvensen kan være, at projektet ikke bliver implementeret fuldt ud og de tiltænkte gevinster udebliver.

Dato: 25. oktober 2017

Sags ID: SAG-2017-05543
Dok. ID: 2437128

E-mail: RALU@kl.dk
Direkte: 3370 3134

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 4 af 4

Organisering

Fase 3 og 4 organiseres som en fortsættelse af fase 1 og 2, dvs. i en særskilt projektenhed i KL. For at sikre kontinuitet i projektet, søges det at styregruppen for fase 1 og 2 fortsætter i fase 3 og 4. Styregruppen er sammensat af kommunale repræsentanter, KOMBIT, Børne- og Socialministeriet og KL
