

STATUS-/ORIENTERINGSMØDE VEDR. NY FUNKTIONALITET_DÆKNINGER PÅ KMD AKTIV FORDRINGER

BØLGE 7

Kommunernes ydelsessystem - KY

Dato: 21.04.2022

Version: Endelig

Forfatter: Netcompany

Kontakt:

netcompany

Agenda

- Status - Plan for KMD Aktiv Fordringer
- Håndtering af dækninger på KMD Aktiv fordringer

✓ • *Frem til 8. September 2022*

- *Efter 8. September 2022*

- Næste skridt

- Status Bølge 7
- Afrundning



KMD Aktiv fordringer i KY

Release 1.6

9. December 2021

Indlæsning og
sagstilknytning af
KMD Aktiv
fordringer

Release 1.6.2

17. marts 2022

Oprettelse og
nedreguleringer af
KMD Aktiv
fordringer

Release 2.0

8. september 2022

Behandl dækninger,
afskrivninger og
nedregulering af
KMD Aktiv
fordringer

DÆKNINGER


PÅ KMD AKTIV FORDRINGER

Efter 8. september 2022

Release 2.0

Hvornår? Releasen er planlagt til at komme i KY 8. september 2022

Hvad? KY vil herefter i videst muligt omfang *automatisk* behandle dækninger, afskrivninger og nedreguleringer ifm. KMD Aktiv fordringer.

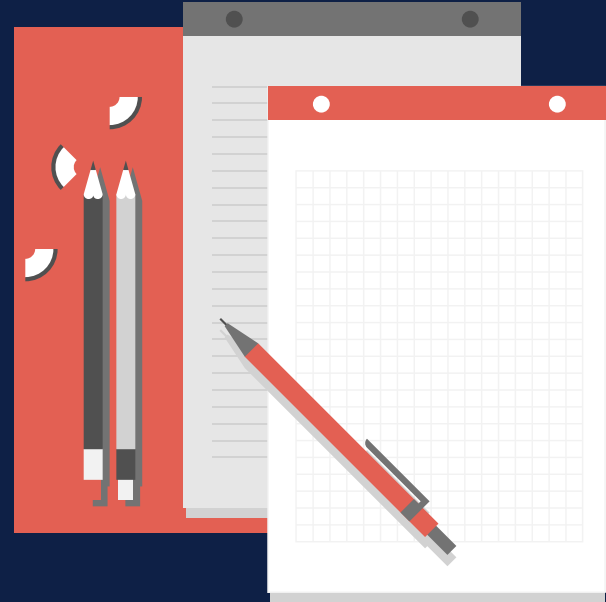

Begrebsafklaring



Dækning

En dækning betyder, at borger laver en indbetaling på en fordring

Kan også kendes som: indbetaling

Begrebsafklaring



Nedregulering

—
Når man nedregulerer en KMD Aktiv fordring betyder det, at man gør hovedstolen mindre.

Borgers fordring har måske været oprettet ved en fejl og skal derfor nedreguleres – altså beløbet, som borger skylder, skal være mindre eller måske fjernes helt.

Begrebsafklaring



Afskrivning

—

En afskrivning nedskriver helt eller delvist den del af debtors restance, som knytter sig til fordringen, dvs. gælden på fordringen nedskrives


Som for KY fordringer, vil KY ikke indberette til EIndkomst og ØiR Finans ved modtagelse af en afskrivning ej heller ved en nedregulering af en afskrivning ifm. KMD Aktiv fordringer.

Det vil fremgå på fordringsfanen, hvilke afskrivninger der er foretaget

Ny opgave til håndtering af dækninger på KMD Aktiv fordringer – i korte træk

—
Hvad? Der implementeres en ny proces i KY til håndtering af dækninger og nedreguleringer vedr. KMD Aktiv fordringer.

Processen håndterer automatisk kontering og indberetning til elndkomst ved KMD Aktiv fordringer.

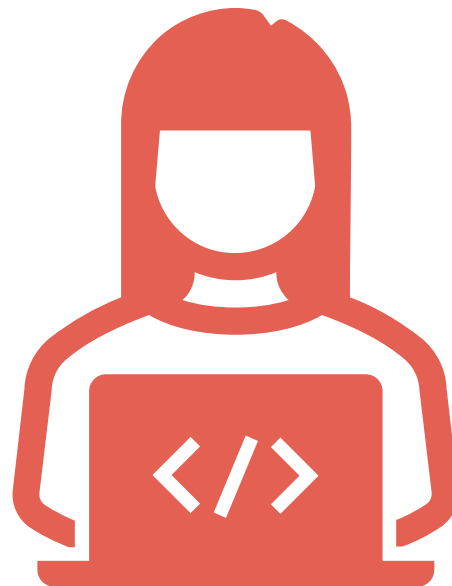

Opgaven vil gå i ventetrin, hvis en af følgende er gældende:

- Debitorkontoen for fordringen ikke er sagstilknyttet
 - ✓ **Løsning:** Sagsbehandler tilknytter debitorkontoen i opgaven "Opret fordringssag"
- Der er ikke angivet en ydelsestype på fordringen
 - ✓ **Løsning:** Sagsbehandler angiver ydelsestypen i opgaven "Skift af ydelsestype på en KMD Aktiv fordring"
- Der findes igangværende opgaver af "Rediger sagstilknytning" eller "Skift af ydelsestype på en KMD Aktiv fodring"
 - ✓ **Løsning:** De igangværende opgaver gennemføres
- Ydelsesopsætningen for ydelsestypen er ikke fyldestgørende til automatisk kontering og indberetning til elndkomst
 - ✓ **Løsning:** Supportsag oprettes via MinSupport



Bemærk: Når disse betingelser er opfyldt, vil opgaven gå ud af ventetrinnet

Angivelse af ydelsestype – Ny KLIK-opgave

Den automatiske proces for håndtering af dækninger og nedreguleringer bestemmes af den ydelsestype, der er angivet på fordringen. Kommunerne skal derfor sikre, at ydelsestype er angivet på fordringen.

Derfor publiceres der en ny KLIK-opgave:

”MI 38 Angiv manglende ydelsestype på KMD Aktiv fordringer”

KLIK-opgaven publiceres bølgevist:

- Pilotkommune: Startdato 8. september – slutdato 22. september
- Pilot - Bølge 3: Startdato 29. september – slutdato 13. oktober
- Bølge 4 – Bølge 7: Startdato 20. oktober – slutdato 3. november

- Indlæsning for de respektive bølger påbegyndes dagen efter slutdato på KLIK-opgaven MI 38

SPØRGSMÅL



Agenda

- ✓ • Plan for KMD Aktiv Fordringer
- Håndtering af dækninger på KMD Aktiv fordringer
- ✓ • *Frem til 8. September 2022*
- ✓ • *Efter 8. September 2022*
- Næste skridt og afrunding



NÆSTE SKRIDT OG AFRUNDING

Næste skridt

- MI 35 igangsættes
 - Eftersom kontering forudsætter, at kommuner har foretaget mapning af TY og KARY ydelser i KYs finanssortiment
 - Startdato medio juni – slutdato ultimo august
 - Webinarer afvikles i juni – uge 24-26 - invitation fremsendes til kommunens projektleder
- Bølge 4 og 5 igangsættes
 - Bølge 4 har Go live den 16. maj
 - Bølge 5 har Go live den 30. maj
- Bølgeplan opdateres og publiceres uge 17



SPØRGSMÅL



Agenda

- ✓ • Plan for KMD Aktiv Fordringer
- Håndtering af dækninger på KMD Aktiv fordringer
- ✓ • *Frem til 8. September 2022*
- ✓ • *Efter 8. September 2022*
- ✓ • Næste skridt

-
- Status Bølge 7
 - Afrundning




STATUS BØLGE 7



- KY Gatemodel -



GO-Live 02-05-2022

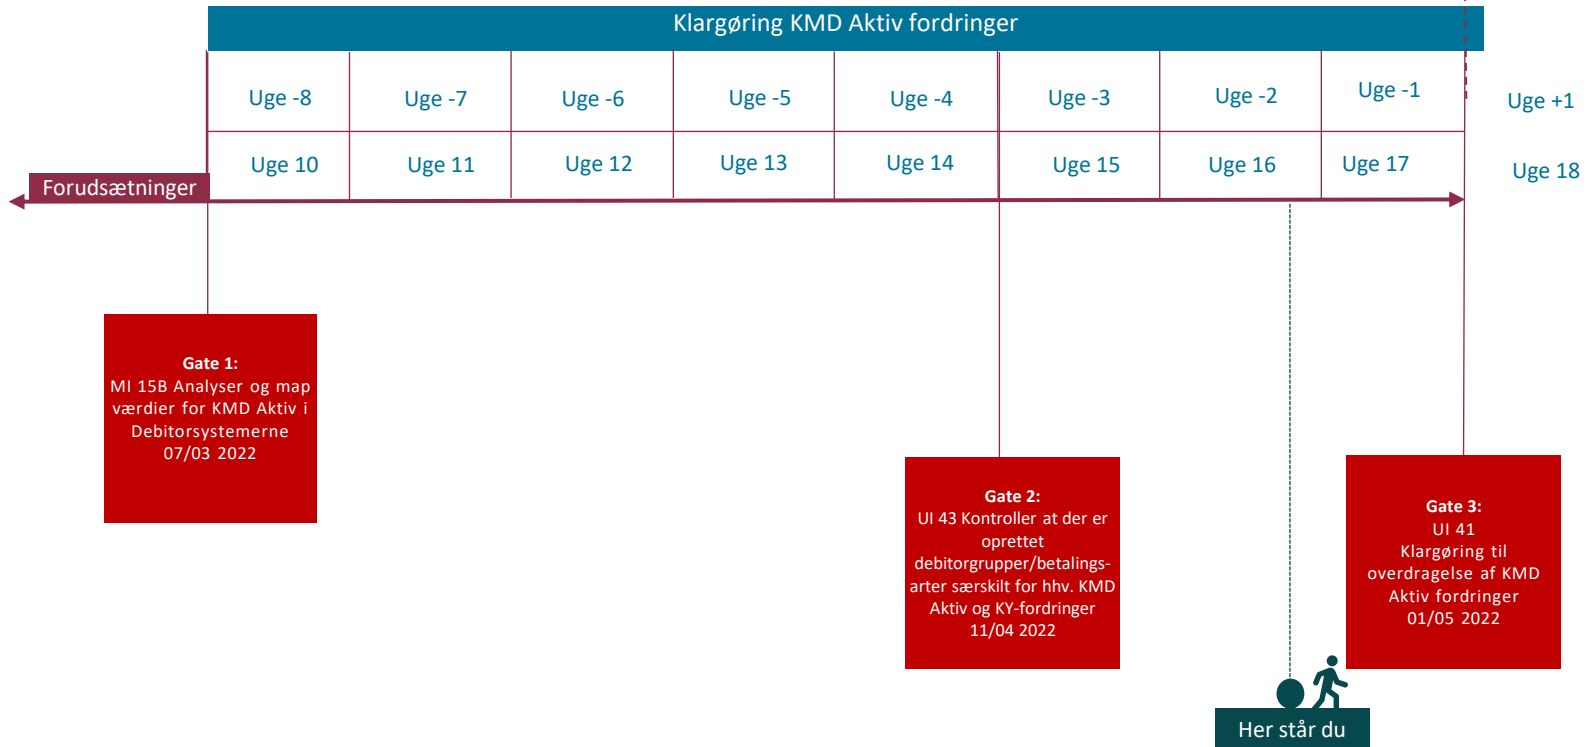

Plan

Primært fokus Gate 1 + 2

- **Gate 1 passeret**


- **MI 15B Analyser og map værdier for KMD Aktiv i Debitorsystemerne (deadline 07.03.2022)**

- Fuldført af 10/12
- Påbegyndt 1/12
- Ikke påbegyndt 1/12

- *Tidshorisont for hvornår opgaven forventes fuldført skrives i KLIK i dag med deadline 15.00*

- **Gate 2**

- **UI 43 Kontroller at der er oprettet debitorgrupper/betalings-arter særskilt for hhv. KMD Aktiv og KY-fordringer (deadline 11.04.2022)**
 - Fuldført af 11/12
 - Ikke påbegyndt 1/12

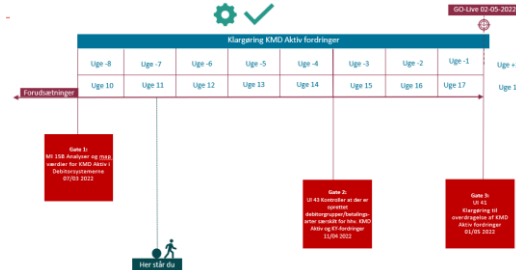


Plan

Sekundært fokus Gate 3

- Gate 3
 - UI 41 Klargøring til overdragelse af KMD Aktiv fordringer

Sideløbende fokus på oprydning samt færdiggørelse af opgaver fx indberetninger og indbetalinger i debtorsystemet

- Påbegyndt 4/12
- Ikke påbegyndt 8/12

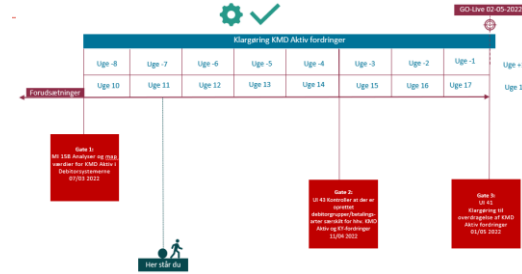

Afrunding

- Er der noget I savner svar på?

Agenda

- ✓ • Plan for KMD Aktiv Fordringer
 - Håndtering af dækninger på KMD Aktiv fordringer
 - ✓ • *Frem til 8. September 2022*
 - ✓ • *Efter 8. September 2022*
 - ✓ • Næste skridt og afrunding
-
- ✓ • Status Bølge 7
 - ✓ • Afrunding



TAK FOR I DAG 😊

AFRUNDNING
